

RIQUALIFICAZIONE DELLA ZONA INDUSTRIALE DI MANCASALE (Q-890)

LOTTO B

REGISTRO DI CONTABILITA' N°2


GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Massimo Magnani

Coordinamento del programma
Ing. David Zilioli

Progetto architettonico
Arch. Francesca Saccani
Ing. Matteo Chiari
Geom. Annalisa Rinaldi

Progetto impianti elettrici
P.I. Giuseppe Beltrami

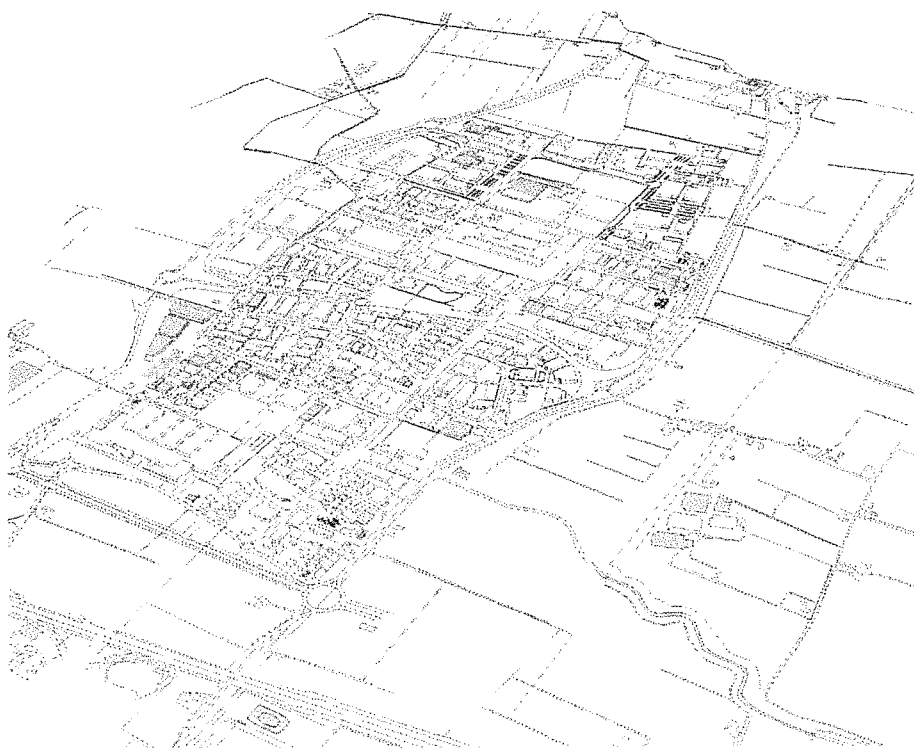

06/12/2016

COMUNE DI REGGIO EMILIA
P.ZZA C. PRAMPOLINI,1
42100 REGGIO EMILIA

REGISTRO DI CONTABILITA' - S.A.L. 2										
N.ro ord.	Data della rilevazione	Articolo dell'elenco	INDICAZIONE del lavori e delle somministrazioni	LIB.TO		PRODOTTI positivi e negativi	PREZZO unitario	IMPORTO		
				N	PAG			LIQUIDATO	%	
			Riporto					392.977,11		
			Euro							
1	06/12/16	C1 C1.1	ASSI STRADALI VIA FILANGIERI	Totale corpo	1	22	0,23	344.272,02	80.410,23	23%
2	06/12/16	C1.2	SISTEMAZIONE ROTATORIE	Totale corpo	1	28	0,29	93.922,04	27.432,86	29%
3	06/12/16	C2	ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Totale corpo			0,00	126.945,40	0,00	0%
5	06/12/16	C4 C4.1	ESTENSIONE BANDA LARGA E MARCIAPIEDI MARCIAPIEDI	Totale corpo	1	31	0,43	285.190,12	123.033,82	43%
6	06/12/16	C4.2	RETI FIBRA OTTICA	Totale corpo	1	37	0,69	245.000,00	168.000,00	69%
7	06/12/16	C7	SICUREZZA	Totale corpo	1	38	0,30	34.199,34	10.421,73	30%
SOMMANO LAVORI DEL S.A.L. euro							1.129.528,92	409.298,63	36%	
ONERI SPECIALI								25.289,74		
Importo lavori al lordo del ribasso, escluso gli oneri per la sicurezza								776.986,01		
Da cui detraendo il ribasso contrattuale del -24,50 %								-190.361,57		
Importo lavori al netto del ribasso, escluso gli oneri della sicurezza								586.624,44		
Importo oneri per la sicurezza								25.289,74		
Totale al netto del ribasso/aumento								611.914,18		
SOMMANO A TUTTO IL 06/12/2016								611.914,18		

Reggio Emilia, 06/12/2016

L'Appaltatore
IEMBO MICHELE SRL

Iembo Michele S.r.l.

Il Legale Rappresentante
Ing. CARMINE IEMBO

Il Direttore Lavori
ing. Matteo Chiari

Il Responsabile del Procedimento
arch. Massimo Magnani
