


RIMOZIONE E STOCCAGGIO DELLA STRUTTURA DENOMINATA “AULA SPECIALE” POSTA ALL’INTERNO DEL PALAZZO DI GIUSTIZIA DI REGGIO EMILIA

**MODIFICA AL PROGETTO DEFINITIVO APPROVATO CON DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE I.D. N°217
DEL 19/12/2019**

PROGETTO DEFINITIVO

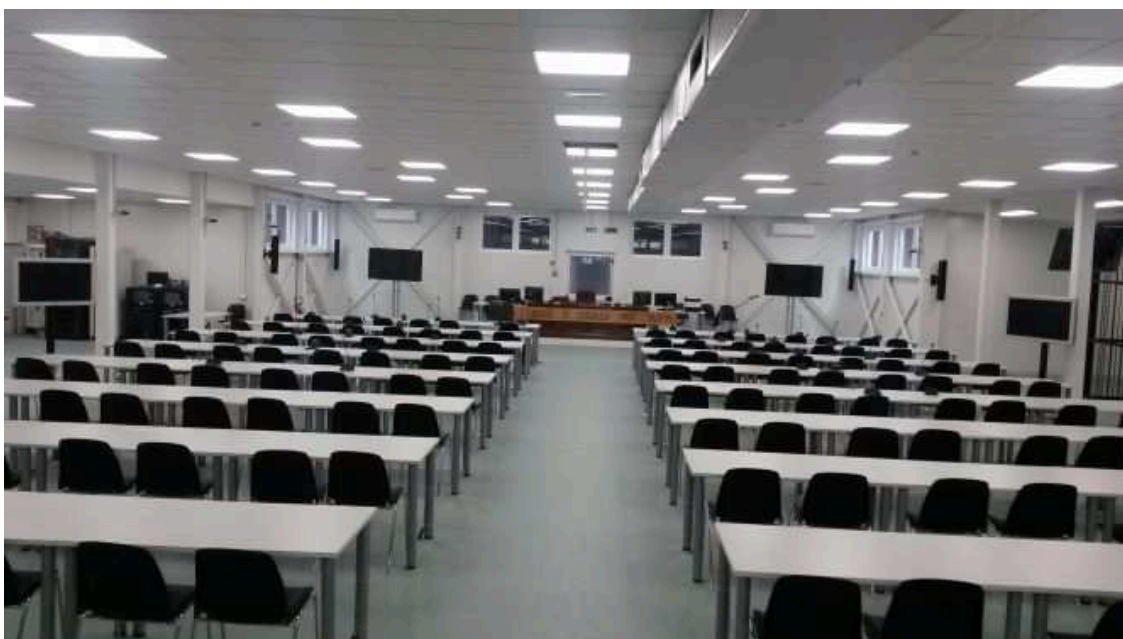

ELENCO PREZZI

Reggio Emilia, 21/04/2020

IL PROGETTISTA
P.I. Giuseppe Beltrami

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
P.I. Giuseppe Beltrami

N°	COD.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO UNITARIO
ELENCO PREZZI				
1	A1	Smontaggio completo di prefabbricato, eseguito con particolare cura, comprensivo di accatastamento, cernita del materiale, identificazione per una futura installazione, trasporti orizzontali, carico su automezzo, trasporto e l'accatastamento del materiale presso i magazzini comunali in via Mazzacurati. Il prefabbricato ha strutture portanti in acciaio e pareti in pannelli tipo sandwich. Le dimensioni da smontare sono di m 14,2X50 + aree laterali m 5X15 con un h. media. Nel prezzo compreso ogni onere per l'uso di macchine e attrezzi e ogni altro onere, compresi trabattelli, ponteggi interni, ecc. Compresa la raccolta differenziata dei rifiuti, l'avvio dei residui inerti e non inerti recuperabili agli impianti per il riciclaggio e il conferimento in discarica degli altri rifiuti. L'opera si ritiene ultimata quando corredata di certificazione della avvenuta consegna dei rifiuti agli impianti di riciclaggio e/o in discarica.	a corpo	€ 84.000,00
2	A2	Smontaggio di controsoffittatura completa in fibra minerale fonoassorbente, eseguito con particolare cura, comprensivo di accatastamento che comprenda la cernita del materiale, la sua identificazione per una futura installazione, i trasporti orizzontali, il carico dentro a container noleggiati dall'amministrazione pubblica. Lo smontaggio comprende tutti i accessori presenti tra i quali i profilati in acciaio, pendini e quant'altro necessario per la sua installazione. Nel prezzo è compreso ogni onere per l'uso di macchine e attrezzi e ogni altro onere, compresi trabattelli, ponteggi interni, ecc. Compresa la raccolta differenziata dei rifiuti, l'avvio dei residui inerti e non inerti recuperabili agli impianti per il riciclaggio e il conferimento in discarica degli altri rifiuti. L'opera si ritiene ultimata quando corredata di certificazione della avvenuta consegna dei rifiuti agli impianti di riciclaggio e/o in discarica.	a corpo	€ 7.000,00
3	A3	Smontaggio completo di impianto di condizionamento e riscaldamento, eseguito con particolare cura, comprensivo di accatastamento che comprenda la cernita del materiale, la sua identificazione per una futura installazione, i trasporti orizzontali, il carico dentro a container noleggiati dall'amministrazione pubblica. Lo smontaggio comprende tutti gli accessori. L'impianto è stato calcolato per temperature invernali - 10° esterno + 20° interno e temperature estive + 40° esterno + 25° interno 10 dual split 12.000 + 18.000 BTU/h classe energetica A+ inverter. Nel prezzo è compreso ogni onere per l'uso di macchine e attrezzi e ogni altro onere, compresi trabattelli, ponteggi interni, ecc. Compresa la raccolta differenziata dei rifiuti, l'avvio dei residui inerti e non inerti recuperabili agli impianti per il riciclaggio e il conferimento in discarica degli altri rifiuti. L'opera si ritiene ultimata quando corredata di certificazione della avvenuta consegna dei rifiuti agli impianti di riciclaggio e/o in discarica.	a corpo	€ 4.200,00
4	A4	Smontaggio, di impianto ricambio aria il tutto eseguito con particolare cura, comprensivo di accatastamento che comprenda la cernita del materiale, la sua identificazione per una futura installazione, i trasporti orizzontali, lo stoccaggio dentro a container noleggiati dall'amministrazione pubblica. L'impianto comprende 1 UTA marca Roccheggiani o similare 8000 mc/h aria con recupero di calore al 50% posizionate sul controsoffitto zona segreteria. 1 canale in lamiera zincata di mandata sez. 0.38 mq. con 5 griglie di aerazione 4 griglie di ripresa incastrate nel controsoffitto. Nel prezzo è compreso ogni onere per l'uso di macchine e attrezzi e ogni altro onere, compresi trabattelli, ponteggi interni, ecc. Compresa la raccolta differenziata dei rifiuti, l'avvio dei residui inerti e non inerti recuperabili agli impianti per il riciclaggio e il conferimento in discarica degli altri rifiuti. L'opera si ritiene ultimata quando corredata di certificazione della avvenuta consegna dei rifiuti agli impianti di riciclaggio e/o in discarica.	a corpo	€ 7.000,00

N°	COD.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO UNITARIO
ELENCO PREZZI				
5	A5	Smontaggio, di impianto elettrico completo, il tutto eseguito con particolare cura, comprensivo di accatastamento che comprenda la cernita del materiale, la sua identificazione per una futura installazione, i trasporti orizzontali, lo stoccaggio dentro a container noleggiati dall'amministrazione pubblica. Le calate sulle pareti sono a vista in tubo pvc autoestinguente e la distribuzione è sul controsoffitto. Nel prezzo è compreso ogni onere per l'uso di macchine e attrezzi e ogni altro onere, compresi trabattelli, ponteggi interni, ecc. Compresa la raccolta differenziata dei rifiuti, l'avvio dei residui inerti e non inerti recuperabili agli impianti per il riciclaggio e il conferimento in discarica degli altri rifiuti. L'opera si ritiene ultimata quando corredata di certificazione della avvenuta consegna dei rifiuti agli impianti di riciclaggio e/o in discarica. L'impianto comprende 1 quadro elettrico, 13 punti luce emergenza, 96 punti luce Led con schermo, 26 postazioni di lavoro con prese di corrente e predisposizione rete dati.	a corpo	€ 7.000,00
6	A6	Smontaggio, di impianto rilevazione incendi il tutto va eseguito con particolare cura, comprensivo di accatastamento che comprenda la cernita del materiale, la sua identificazione per una futura installazione, i trasporti orizzontali, lo stoccaggio dentro a container noleggiati dall'amministrazione pubblicarealizzato. L'impianto è realizzato su due livelli, sopra controsoffitto e aula con ripetitori di segnale e comandi manuali integrati a sistemi ottico-acustici. Nel prezzo è compreso ogni onere per l'uso di macchine e attrezzi e ogni altro onere, compresi trabattelli, ponteggi interni, ecc. Compresa la raccolta differenziata dei rifiuti, l'avvio dei residui inerti e non inerti recuperabili agli impianti per il riciclaggio e il conferimento in discarica degli altri rifiuti. L'opera si ritiene ultimata quando corredata di certificazione della avvenuta consegna dei rifiuti agli impianti di riciclaggio e/o in discarica.	a corpo	€ 3.500,00
7	A7	Smontaggio, di impianto antintrusione il tutto eseguito con particolare cura, comprensivo di accatastamento che comprenda la cernita del materiale, la sua identificazione per una futura installazione, i trasporti orizzontali, lo stoccaggio dentro a container noleggiati dall'amministrazione pubblica. L'impianto è composto da centrale digitale, sensori a doppia tecnologia con antimascheramento, tastiera di programmazione, sirene di segnalazione e dispositivo di comunicazione remota con centrale di vigilanza. Nel prezzo è compreso ogni onere per l'uso di macchine e attrezzi e ogni altro onere, compresi trabattelli, ponteggi interni, ecc. Compresa la raccolta differenziata dei rifiuti, l'avvio dei residui inerti e non inerti recuperabili agli impianti per il riciclaggio e il conferimento in discarica degli altri rifiuti. L'opera si ritiene ultimata quando corredata di certificazione della avvenuta consegna dei rifiuti agli impianti di riciclaggio e/o in discarica.	a corpo	€ 3.200,00
8	A8	Smontaggio, di coperture per zona di accesso all'aula con pedana in alluminio grecato, il tutto eseguito con particolare cura, comprensivo di accatastamento che comprenda la cernita del materiale, la sua identificazione per una futura installazione, i trasporti orizzontali, lo stoccaggio dentro a container noleggiati dall'amministrazione pubblica del materiale deperibile e trasporto con sistemazione presso i magazzini comunali in via Mazzacurati del rimanente. Le Dimensione n° 3 6x2,5 m. Nel prezzo è compreso ogni onere per l'uso di macchine e attrezzi e ogni altro onere, compresi trabattelli, ponteggi interni, ecc. Compresa la raccolta differenziata dei rifiuti, l'avvio dei residui inerti e non inerti recuperabili agli impianti per il riciclaggio e il conferimento in discarica degli altri rifiuti. L'opera si ritiene ultimata quando corredata di certificazione della avvenuta consegna dei rifiuti agli impianti di riciclaggio e/o in discarica.	a corpo	€ 12.600,00

N°	COD.	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO UNITARIO
ELENCO PREZZI				
9	A9	Smontaggio e recupero di tavoli con telaio in acciaio e piano di lavoro in materiale sintetico lavabile classe 1M, piedi pieghevoli, il tutto eseguito con particolare cura, comprensivo di accatastamento che comprenda la cernita del materiale, trasporti orizzontali, lo stoccaggio dentro a container noleggiati dall'amministrazione pubblica. Dimensioni 130x75 cm n. 130	a corpo	€ 2.800,00
10	A10	Recupero di seggiola con telaio in acciaio e seduta in materiale sintetico lavabile classe 1M, impilabile, il tutto eseguito con particolare cura, comprensivo di accatastamento e di trasporti orizzontali, lo stoccaggio dentro a container noleggiati dall'amministrazione pubblica n. 350	a corpo	€ 2.800,00
11	A11	Rimozione di lastre in cartongesso di rivestimento dei pilastri comprensivi di montanti verticali, guide a pavimento e a soffitto in metallo. Il prezzo comprende ogni onere per l'uso di macchine e attrezzi e ogni altro onere, compresi trabattelli, ponteggi interni, ecc. Compresa la raccolta differenziata dei rifiuti, l'avvio dei residui inerti e non inerti recuperabili agli impianti per il riciclaggio e il conferimento in discarica degli altri rifiuti. L'opera si ritiene ultimata quando corredata di certificazione della avvenuta consegna dei rifiuti agli impianti di riciclaggio e/o in discarica.	a corpo	€ 1.400,00
12	A12	Oneri per la sicurezza	a corpo	€ 4.900,00

Il progettista
p.i. Giuseppe Beltrami
